گزارش مهر ۱۴۰۵

تاریخ گزارش: ۲۵ مهر ۱۴۰۵

پیشرفت کل پروژه

٪۳۷

برنامه‌ای: ٪۴۳.۸

پیشرفت بلوک‌ها

بلوک ۱	٪۵۲.۳	
بلوک ۲	٪۴۴.۲	
بلوک ۳	٪۳۱	
بلوک ۴	٪۱۸.۹	

شرح

اسکلت بلوک ۱ در آستانه‌ی اتمام است؛ دیوارچینی و تأسیسات بلوک‌های ۱ و ۲ آغاز شده است.

بلوک ۱ — ٪۵۲.۳

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	**۱۰۰٪**	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	**۱۰۰٪**	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	**۱۰۰٪**	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	**۹۵٪**	٪۸۵.۴	
دیوارچینی	۱۰۰۰	**۲۰٪**	٪۴.۸	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	**۱۵٪**	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	**۱۵٪**	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	**۰٪**	۰٪	
نما	۶۰۰	**۰٪**	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	**۰٪**	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	**۰٪**	۰٪	

بلوک ۲ — ٪۴۴.۲

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	**۱۰۰٪**	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	**۱۰۰٪**	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	**۱۰۰٪**	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	**۷۰٪**	٪۷۹.۹	
دیوارچینی	۱۰۰۰	**۲۰٪**	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	**۵٪**	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	**۵٪**	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	**۰٪**	۰٪	
نما	۶۰۰	**۰٪**	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	


بلوک ۳ — ۳۱٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	۳۲٪	۷۴.۵٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	۰٪	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
نما	۶۰۰	۰٪	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	۰٪	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

بلوک ۴ — ۱۸.۹٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	۶۵٪	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	۴٪	۶۹٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	۰٪	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
نما	۶۰۰	۰٪	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	۰٪	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	


تصاویر

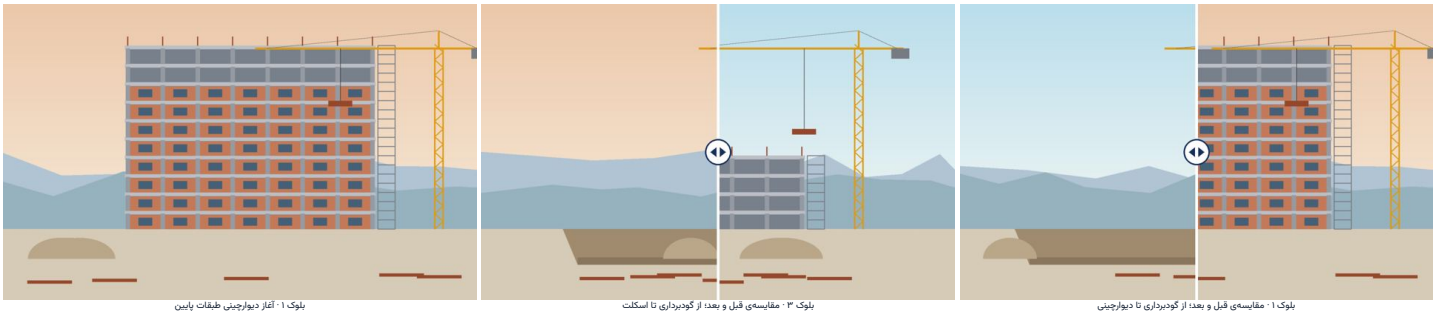


بلوک ۱ · مقایسه‌ی قبل و بعد: از گودبرداری تا دیوارچینی

بلوک ۳ · مقایسه‌ی قبل و بعد: از گودبرداری تا اسکلت


بلوک ۱ · آغاز دیوارچینی طبقات پایین

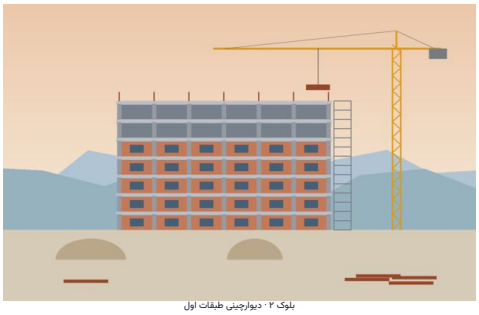

بلوک ۲ · دیوارچینی طبقات اول

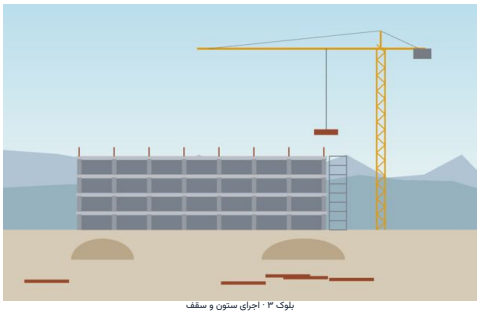

بلوک ۳ · اجرای ستون و سقف

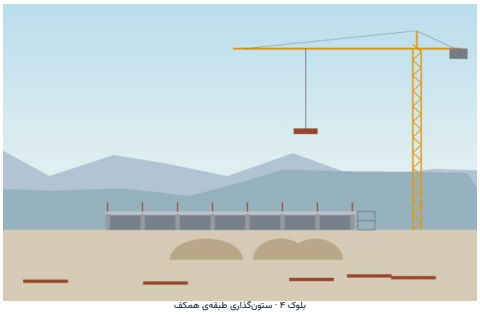

بلوک ۴ · ستون‌گذاری طبقه‌ی همکف

تهیه‌شده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ · ۱۵:۱۰ · وضعیت گزارش: منتشرشده
